



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCEER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016


13 de diciembre de 2016

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			Ejecución Real	SITUACION	OBSERVACION
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%			

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2016:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	38	42.22%
Obras en proceso	38	42.22%
Obras pendientes	14	15.56%
TOTAL	90	100.00%

13

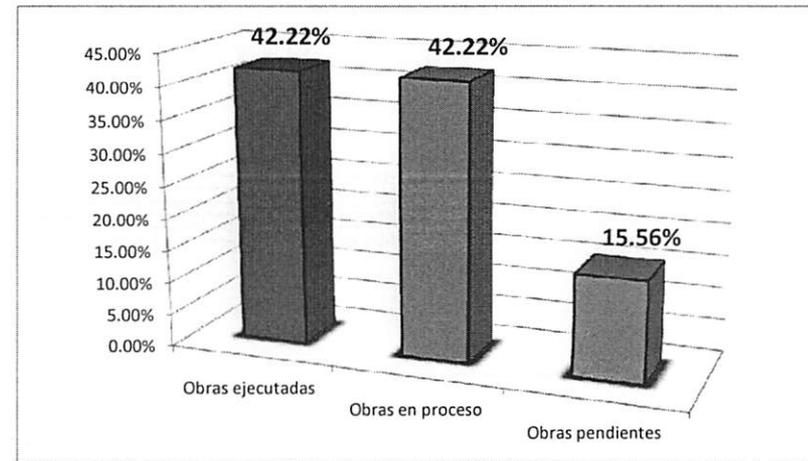

ce de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
195,879,114.52	94,935,055.29	100,944,059.24	48%

***Nota:** Las 14 obras pendientes de ejecución, tenemos 13 obras licitadas (pendientes de iniciar) y un equipamiento.-



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

13 de diciembre de 2016

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Ejecución Real	SITUACION	OBSERVACION
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE			
79	100/2016	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. CORAZÓN DE JESÚS), SECTOR BRISA DEL ESTE	ING. OSIRIS A. DECENA ESPINAL	2,844,362.27	568,872.45					20.00%	En ejecución	En ejecución (se pagará el avance y el resto pasará 2017)
80	101/2016	ASFALTADO DE CALLES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	ING. ARIEL CASTRO DISLA	2,133,018.00	426,603.60					20.00%	En ejecución	En ejecución
81	104/2016	REPARACION DE CANCHA, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	ING. JUAN ODALIS MARTINEZ BAEZ	2,031,453.01	406,290.60					20.00%	En ejecución	En ejecución
82	105/2016	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAÑA, SECTOR EL ALMIRANTE	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GPIS SRL	2,761,383.41	552,276.68					20.00%	En ejecución	
83		ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V UNIÓN PROGRESO), SECTOR AGUAS LOCAS		3,729,836.10						0.00%	Licitada y con picazo solicitado	
84		REPARACION DE MULTUSOS, RES. LOS TRES OJOS		2,101,350.30						0.00%	Licitada	
85	103/2016	ENCALICHADO (RELLENO) DE CALLES, SECTOR DE NUEVO AMANECER	CONSTRUCTORA BIERAM, SRL	1,903,386.60	380,677.32					20.00%	En ejecución	
86	102/2016	CONSTRUCCION BOULEVARD, URB. EL ROSAL IVETT, ALMA ROSA	ING. JOSE TAVAREZ VENTURA	3,900,000.00	780,000.00					20.00%	En ejecución	
87	106/2016	CONSTRUCCION DE GLORIETAS PARQUE, RES. DEL ESTE	AURICA, SRL	2,404,000.00	480,800.00					20.00%	En ejecución	
88		ILUMINACION, SECTOR CERROS DEL OZAMA		2,049,475.45						0.00%	Licitada	
89		EQUIPAMIENTO SALON MULTUSOS, SECTOR LOS MINA NORTE		1,500,000.00						0.00%	Equipamiento	
90	096/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y COTENES (FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	ING. ELIAS ANT. MADERA	2,020,115.01	404,023.00					20.00%	En ejecución	Licitada (se pagará el avance y el resto pasará 2017)
				195,879,114.52	94,935,055.29							


FIRMA ALCALDIA

13/12/2016
FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
 PERIODO ENERO / JUNIO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

13 de diciembre de 2016

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Ejecución Real	SITUACION	OBSERVACION
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE			
65	084/2016	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V. LA GLORIA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	Ing. Rubelina Del Orbe	2,015,394.86	2,015,394.86	100.00%			SI, cheque 74107	100.00%	Finalizada	Finalizada, se pagó el avance
66	085/2016	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. UNIDA PARA EL BARRIO), SECTOR LOS MINAS	ARQ. JOSE ANIBAL ACEVEDO	1,933,435.66	375,327.95			19.4%	SI	60.00%	En ejecución	Se esta vaceando un callejon. Porcentaje de ejecución: 20%
67	087/2016	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, CANCINO ADETRON	ARQ. JOSE ANIBAL ACEVEDO	2,004,110.45						30.00%	En ejecución	En ejecución
68	088/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y COTENES (J.V. NUEVO AMANECER), SECTOR NUEVO AMANECER	ING. ANASTACIA DIAZ VICTORIA	2,136,337.05	1,658,588.57		77.64%			77.64%	En ejecución	En ejecución, se pagó el avance
69	089/2016	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. SAN LORENZO), LOS MINA VIEJO	GRUPO A TRES, SA	2,619,212.58						0.00%	No iniciada	Licitada y con picazo solicitado
70	090/2016	ELECTRIFICACION E ILUMINACION, SECTOR BRISAS DE MENDOZA	GRUPO A TRES, SA	3,269,763.18	653,952.64			20.0%	SI	20.00%	Licitada y con picazo solicitado	Licitada y con picazo solicitado
71	091/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. NUEVA ALIANZA), INVIVIENDA	ING. EMIL DOTEL RODRIGEZ	1,990,149.00						100.00%	Finalizada	Falta cubicación de cierre
72	092/2016	ASFALTADO, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. DON OSCAR	Ing. Raymundo de Jesus Abreu	2,036,337.05						70.00%	En ejecución	Se pretendia asfaltar el dia de hoy (09-11-16) pero se suspendió por lluvia. Porcentaje de ejecucion: 70%
73	093/2016	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. LOS CORALES 1RA ETAPA), SECTOR EL ALMIRANTE (1RA ETAPA)	ING. OSIRIS A. DECENA ESPINAL	2,810,321.21	562,064.24					20.00%	En ejecución	Licitada, no ha iniciado (se pagará el avance y el resto pasará 2017)
74	094/2016	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. RESTAURACION), SECTOR EL ALMIRANTE	ING. JOSE ANT. TAVERAS	3,352,015.92	670,403.18					20.00%	En ejecución	Licitada (se pagará el avance y el resto pasará 2017)
75	095/2016	CONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR LOS EDUCADORES	CONSTRUCTORA BIERAM, SRL	2,800,532.35						0.00%	No iniciada	Licitada, no ha iniciado (se pagará el avance y el resto pasará 2017)
76	097/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, BO. MAQUITTERIA, SECTOR VILLA DUARTE	Ing. Francisco A. Ramirez	2,001,749.00	400,349.80			20.0%	SI	20.00%	En ejecución	Licitada, ejecución (se pagará el avance y el resto pasará 2017)
77	098/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR PRADOS DEL CACHON	ING. MERCEDES BRITO GERMAN	2,335,312.22	467,062.44					20.00%	En ejecución	Licitada, en ejecución (se pagará el avance y el resto pasará 2017)
78	099/2016	REPARACION PLAY, SECTOR LUCERNA	ING. RAQUEL JOSEFINA GOMEZ	2,912,258.35						0.00%	No iniciada	Licitada, no ha iniciado (se pagará el avance y el resto pasará 2017)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

13 de diciembre de 2016

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Ejecución Real	SITUACION	OBSERVACION
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE			
52	070/2016	SOLUCIÓN DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	Ing. Julio Cesar Martinez	2,085,286.02	417,057.20			20.0%	NO	35.00%	En ejecución	Paralizada, ya el contratista cerro los colectores ya que representaban un peligro para la comunidad. Alega espera el avance. Porcentaje de ejecución: 26%
53	072/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V INVIMOSA II), SECTOR INVIMOSA	Arq. Jhoanna Altagracia Fortuna	1,834,164.58	1,834,164.58	100.00%			SI	100.00%	Finalizada	Finalizada, se pagó el avance
54	073/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUZ DE VILLA ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO	Ing. Julio Cesar Martinez	1,831,993.78	366,398.76			20.0%	NO	45.00%	En ejecución	Paralizada a falta de pago. Porcentaje de ejecución: 45%
55	074/2016	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, RES. ORIENTAL, SECTOR VILLA FARO	Ing. Edward Cabrera	1,817,051.07	1,817,051.07	100.00%		20.0%	SI, cheque 74079	100.00%	Finalizada	Finalizada y pagada
56	075/2016	ILUMINACIÓN DE PLAY, URB. ITALIA, VILLA FARO	Ing. Marcelino Sandoval Gil	2,500,000.00	524,586.81		20.98%		SI	20.98%	En ejecución	En ejecución
57	076/2016	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V. MILENIUM), SECTOR VILLA FARO	Arq. Andy Jose Zapata Garica	2,539,474.04	2,394,215.37		94.28%		SI, cheque 74108	100.00%	Finalizada	Falta cubicación de cierre
58	077/2016	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION TRAMO DE CAÑADA, BO. SANTO TOMAS DE AQUINO, LOS TRES BRAZOS	Ing. Pablo Amaris Soto Pérez	2,013,996.50	532,009.73			26.42%	NO	26.42%	En ejecución	En ejecución
59	078/2016	SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA (J.V. NUEVA ESPERANZA), BO. RIVERA DEL OZAMA	Ing. Maria Dolores Leocadio	1,428,423.03	1,428,423.03	100.00%		20.0%	SI	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
60	079/2016	SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA (J.V. MOVIMIENTO ACCIÓN PRO-AMBIENTE), BO. RIVERA DEL OZAMA	Ing. Thania Magdalena Rodríguez Castillo	1,977,305.09	1,977,305.09	100.00%		20.0%	SI, cheque 74099	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
61	080/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V LUZ Y ESFUERZO), SECTOR LOS MINA	Ing. Federico A. Pérez Espinal	2,050,350.00	1,028,023.16			50.14%	SI, cheque 74318	50.14%	En ejecución	En ejecución, se pagó el avance
62	081/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V VILLA VENEZUELA), SECTOR LOS MINA	Ing. Annery Ramírez Medrano	2,062,521.12	412,504.22			20.0%	SI	35.00%	En ejecución	En ejecución
63	082/2016	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, SECTOR RIVERA DEL CARIBE	Ing. Jose E. Familia Taveras	2,550,283.89	2,447,474.23	95.97%			SI, cheque 74112	95.97%	En ejecución	En ejecución, se pagó el avance
64	083/2016	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. LA UNIÓN), Bo. VILLA ESFUERZO	Ing. Carlos Castro	2,028,533.21	1,451,447.16		71.55%		SI, cheque 74282	71.55%	En ejecución	En ejecución, se pagó el avance



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

13 de diciembre de 2016

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Ejecución Real	SITUACION	OBSERVACION
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE			
42	058/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL CACHÓN DE LA RUBIA), BO. CACHÓN DE LA RUBIA	Urvisa SRL	2,025,293.19	405,058.64			20.0%	NO		No Iniciada	Licitada y con picazo
43	059/2016	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V. BRISA DEL ESTE II), SECTOR DE BRISA DEL ESTE	Ing. Marcelino Santana Gil	2,787,358.50	1,439,672.35		51.65%	20.0%	SI, cheque 74096	51.65%	En ejecución	Tiene los postes izados y los planos fueron aprobados por EDEESTE. Porcentaje de ejecución: 52%
44	060/2016	IMPRIMACION DE CALLES (J.V. EL PENSADOR I), BO. EL PENSADOR, SECTOR LOS MAMEYES	Ecovial SRL	2,026,288.27	405,257.65			20.0%	NO	20.00%	Licitada y con picazo	No iniciada, en espera de avance
45	061/2016	IMPRIMACIÓN DE CALLES, SECTOR LOS CORALES DEL ALMIRANTE	Ing. Nestor Julio Matos	1,932,854.15	1,932,854.15	100.00%		20.0%	NO	100.00%	Finalizada	Finalizada, se pagó el avance
46	062/2016	CONSTRUCCION DE PARQUE, CALLE PROF. SIMON OROZCO, INVIVIENDA	Arq. Johanna Altagrafia Fortuna	2,137,136.93	427,427.39			20.0%	NO	20.00%	En ejecución	En ejecución
47	064/2016	REPARACIÓN DE CANCHA, CLUB LOS TRINITARIOS	Ing. Edmon José Fajar Santos	2,015,008.52	403,001.70			20.0%	NO	38.00%	En ejecución	Concluyó el vaciado de zapatas y columnas. Se le está procesando la 1ra cubicación. Porcentaje de ejecución: 38%
48	066/2016	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION TRAMOS DE CAÑADA (J.V. EL DIQUE ABAJO), EL DIQUE ABAJO (DIQUE SECO)	Ing. Alfonso Bidó	1,514,758.07	1,514,758.07	100.00%			SI	100.00%	Finalizada	Finalizada, se pagó el avance
49	067/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLOVIAL (CONSEJO DE DESARROLLO VILLA FARO), SECTOR VILLA FARO	Capvisa SRL	2,015,562.83	403,112.57			20.0%	NO	20.00%	No Iniciada	Licitada y con picazo
50	068/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLOVIAL (J.V. UNIÓN Y PAZ I), BO. SAN BARTOLO, FRAILES II	Ing. Mariennys Cortoreal	2,010,281.18	2,010,281.18	100.00%		20.0%	SI	100.00%	Finalizada	Finalizada, se pagó el avance
51	069/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLOVIAL (J.V. REINA DE PAZ), LA ZAFRA, SECTOR LOS MINA	Ing. Cristian Francisco Gomez	2,008,362.77	401,672.55			20.0%	NO	100.00%	Finalizada	Falta cubicación de cierre



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

13 de diciembre de 2016

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Ejecución Real	SITUACION	OBSERVACION	
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE				
28	039/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FUNDACIÓN OSCAR MONTERO), BO. SAN BARTOLO, SECTOR LOS FRAILES II	L & L Desing, SRL	2,087,741.09	417,548.22				20.0%	NO	20.00%	En ejecución	En ejecución
29	040/2016	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR TROPICAL DEL ESTE	Ing. Enmanuel Maldonado Tapia	1,984,117.38	1,906,397.91		96.08%			SI, cheque 74188	96.08%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
30	041/2016	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR LOS CORALES DEL ALMIRANTE	Isamely Cabrera Bello	2,040,715.70	950,157.23				46.56%	SI, cheque 74279	46.56%	En ejecución	Se está trabajando en los colectores. Porcentaje de ejecución: 63.80%
31	042/2016	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V VILLA VENECIA), SECTOR INVIVIENDA	Ing. Ramón Antonio Flores	1,845,270.58	1,845,270.58	100.00%				SI, cheque 74097	100.00%	Finalizada	Finalizada, se pagó el avance
32	043/2016	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, RESP. VILLA CARMEN	Ing. Enmanuel Maldonado Tapia	1,959,156.89	1,959,156.89	100.00%				SI, cheque 74187	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
33	044/2016	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FUNDACIÓN ARIBES), SECTOR LOS FRAILES II	Ing. Jose E. Familia Taveras	2,043,691.32	1,806,474.82		88.39%			SI, cheque 74094	100.00%	Finalizada	Falta cubicación de cierre
34	045/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V HOYO SOLO), SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA	Ing. Cinthia C. Tejeda	1,903,988.47	725,334.52				38.10%	SI, cheque 74073	100.00%	Finalizada	Falta cubicación de cierre
35	046/2016	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V LAS ORQUÍDEAS), CIUDAD DEL ESTE II (CIUDAD SATÉLITE)	Ing. Raymundo de Jesus Abreu	1,974,426.70	1,974,426.70	100.00%			20.0%	SI, cheque 74189	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
36	047/2016	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, RESIDENCIAL CHALON	Construcciones Fem	1,707,983.39	1,707,983.39	100.00%			20.0%	NO	100.00%	Finalizada	Finalizada
37	048/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ALTOS DEL CACHÓN	Ing. Cipriano Tapia Disla	1,985,230.50	397,046.10				20.0%	NO	0.00%	No iniciada	Será reubicada
38	050/2016	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. NUEVO RENACER), C\JOSE CABRERA, BO. ALMA ROSA I	Ing. Raymundo de Jesus Abreu	3,137,661.68	3,137,661.68	100.00%				SI, cheque 74233	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
39	051/2016	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (J.V HERMANAS MIRABAL II), SECTOR LOS FRAILES II	Decora Ingenieria y Pisos	2,036,137.47	407,227.49				20.0%	NO	50.00%	En ejecución	En ejecución
40	052/2016	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V. AMA DE CASA LA ROCA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	Decora Ingenieria y Pisos	1,374,017.27	1,374,017.27	100.00%				SI	100.00%	Finalizada	Finalizada
41	053/2016	CONST. PARQUE, RES. MARIA DOLORES, VILLA FARO	Parix Dominicana	4,004,725.07	800,945.01				20.0%	NO	35.00%	En ejecución	En ejecución



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

13 de diciembre de 2016

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Ejecución Real	SITUACION	OBSERVACION
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE			
15	025/2016	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. BRISAS DEL PERLA	Ing. Edmon José Fajar	1,872,100.70	1,777,543.55		94.95%		SI, cheque 74052	94.95%	En ejecución	En ejecución, primera cub. Pagada
16	026/2016	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS SOLARES, VILLA LIBERACION	INDICOM, SRL	2,007,529.34	1,287,927.78		64.15%		Si	80.00%	En ejecución	En ejecución, se pagó el avance
17	027/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL RENACIMIENTO), BO. PARAÍSO II, SECTOR LA UREÑA	Felix Antonio Montero E.	1,880,661.63	1,880,661.63	100.00%			SI, cheque 74014	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
18	028/2016	ENCALICHADO (RELLENO) DE CALLES (COMITÉ DE AMAS DE CASAS), SECTOR AGUAS LOCAS	Marcus S. Publishing SRL	1,338,205.74	1,338,205.74	100.00%			SI, cheque 74109	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
19	029/2016	ENCALICHADO DE CALLES (J.V LUZ Y ESPERANZA), BO. AGUAS LOCAS	Marcus S. Publishing SRL	1,710,276.45	1,710,276.45	100.00%			SI, cheque 74098	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
20	030/2016	TERMINACION AMPLIACION IGLESIA SAN SIMÓN APÓSTOL, CARRETERA DE MENDOZA, VILLA FARO	AVI CONSTRUCTORA	4,000,000.00	800,000.00			20.0%	NO	20.00%	En ejecución	En ejecución
21	031/2016	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA	Glanton Internacional	2,900,722.03	580,144.41			20.0%	NO	20.00%	En ejecución	En ejecución, se pagó el avance
22	032/2016	IMPRIMACIÓN DE CALLES (J.V UNIÓN Y PROGRESO), SECTOR FRAILES II	Ing. Edwin Peralta Acosta	1,712,397.89	1,712,397.89	100.00%		20.0%	SI, cheque 74064	100.00%	Finalizada	En ejecución, se pagó el avance
23	033/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. VILLA ANACAONA, VILLA FARO	Ing. Diana Leonor Féliz	1,912,686.82	1,322,743.01		69.16%	20.0%	SI	100.00%	Finalizada	falta cubicación de cierre, se pagó el avance
24	034/2016	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	Ing. Laura Marcel Ureña G.	1,934,931.07	1,934,931.07	100.00%		20.0%	NO	100.00%	Finalizada	
25	036/2016	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V RENACIMIENTO), SECTOR LOS MINA	Ing. Freddy A. Peralta Almonte	1,849,200.11	1,849,200.11	100.00%			NO	100.00%	Finalizada	Finalizada
26	037/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. VIETNAM, SECTOR LOS MINA	Daneris Julisa Garcia Montas	1,715,688.85	1,715,688.85	100.00%			SI, cheque 74049	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
27	038/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V ASOC. UNIDA POR EL PROGRESO), SECTOR LOS MINA	Cynthia C. Tejeda	1,862,982.91	631,990.48			33.9%	SI, cheque 74074	100.00%	Finalizada	falta cubicación de cierre



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PROCER MATIAS RAMON MELLA Y CASTILLO EN SDE"
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

13 de diciembre de 2016

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Ejecución Real	SITUACION	OBSERVACION	
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50.0%	AVANCE				
1	009/2016	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. RADIANTE AMANECER	Parix Dominicana	2,102,413.32	420,482.66				20.0%	SI, cheque 73862	20.00%	En ejecución	Se encuentra paralizada. Porcentaje de ejecución: 20%
2	012/2016	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. ACCIÓN, PAZ Y TRABAJO), SECTOR VILLA FARO	Ing. Cipriano Tapia	2,009,680.80	401,936.16				20.0%	NO	20.00%	En ejecución	En ejecución
3	013/2016	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, (J.V 3ER BARRIO), SECTOR LOS MAMEYES	Ing. Cipriano Tapia	1,893,214.94	1,806,226.13		95.41%		20.0%	SI, cheque 74283	95.41%	Finalizada	Finalizada, falta hacer cubicación de cierre, se pagó el avance
4	014/2016	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. RES. TURÍSTICO SAN SOUCI), SECTOR LOS MAMEYES	Ing. Diana Leonor Félix	2,699,341.20	1,290,735.21		47.82%			SI, cheque 74032	90.00%	En ejecución	En ejecución, se pagó el avance
5	015/2016	ARREGLO DE CALLEJONES (COMITE PRO-DESARROLLO MAQUITERIA), SECTOR MAQUITERIA	Ing. Jorge Angomas Velóz	1,956,379.23	1,956,379.23	100.00%				SI, cheque 74043	100.00%	Finalizada	Finalizada, se pagó el avance
6	016/2016	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR TAMARINDO	Ing. Carmen Odette Tineo Rosario	2,069,953.70	413,990.74				20.0%	NO	20.00%	Licitada y con picazo	Licitada y con picazo
7	017/2016	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	Ing. Edwin Peralta Acosta	1,907,765.53	1,907,765.53	100.00%				SI, cheque 74048	100.00%	Finalizada	Finalizada, falta pagar el adicional
8	018/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO (J.V BARBARIN MOJICA), SECTOR VILLA DUARTE	Ing. Jorge Angomas Velóz	1,984,508.09	1,984,508.09	100.00%				SI, cheque 74042	100.00%	Finalizada	Finalizada, se pagó el avance
9	019/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. SAN ANTONIO, SECTOR LOS MINA	Lisette A. de Leon de Los Santos	1,921,234.37	1,921,234.37	100.00%				SI, cheque 74050	100.00%	Finalizada	Finalizada
10	020/2016	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (FUNDACIÓN CENTRO DE SALUD ESTE), CIUDAD DEL ESTE	Felix Antonio Montero E.	1,899,074.91	1,899,074.91	100.00%				SI, cheque 74317	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
11	021/2016	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V JERUSALÉN), SECTOR BRISAS DEL ESTE	Ing. Cristhian Fco. Gomez A.	1,910,146.27	1,910,146.27	100.00%				SI, cheque 74044	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
12	022/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	Anastacia Diaz Victoria	1,944,275.66	1,944,275.66	100.00%				SI, cheque 74063	100.00%	Finalizada	Finalizada, primera cub. Pagada
13	023/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y COTENES (J.V. PAZ Y BIEN), SECTOR SOLARES DEL PERLA	L & L Desing, SRL	2,075,982.70	415,196.54				20.0%	NO	20.00%	Licitada y con picazo	Licitada y con picazo
14	024/2016	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V NUEVA SENDA), SECTOR NUEVO AMANECER	Ing. Francisco A. Ramírez	1,935,300.99	1,935,300.99	100.00%				SI, cheque 74071	100.00%	Finalizada	Finalizada, se pagó el avance
