



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

25 de octubre de 2017

Actualizado: 25/10/2017

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
1	002/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL BRISAL), BO. EL BRISAL. SECTOR LOS 3 BRAZOS	GRUPO GARCOM, SRL	2,270,491.01	En ejecución	Inicio el 18/10/2017
2	003/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (ASOC. DE MUJERES CARIDAD Y AMOR). EL DIOQUE ARRIBA. ENS. OZAMA	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVIÑON	1,607,659.15	En ejecución	Estan dandole terminacion a los escalones
3	004/2017	ASFALTADO CALLES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), BO. AGUAS LOCAS	BIOTEC CONSTRUCCIONES, SRL	2,077,917.62	En ejecución	Imprimaron, hay que evaluar dos colectores
4	005/2017	ASFALTADO DE CALLES (J. V. LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS	ING. JORGE SERANO OVALLE	2,855,091.89	En ejecución	
5	006/2017	ASFALTADO DE CALLES (J. V. LA MILAGROSA), SECTOR LOS MINAS	ING. JORGE SERRANO OVALLE	2,377,705.47	En ejecución	
6	007/2017	ASFALTADO DE CALLES (COMUNIDAD EN ACCIÓN VILLA DUARTIANA), BO. PUEBLO NUEVO. VILLA DUARTE	CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL	1,904,593.34	Finalizada	Adicionales en proceso
7	008/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ASOC. DE MUJERES UNIDOS POR EL PROGRESO). SECTOR NUEVO AMANECER	RDC SOLUCIONES DE INGENIERIA, SRL	1,936,464.44	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
8	009/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FUNDACIÓN MARÍA ALTAGRACIA TURBIDES). SECTOR LA UREÑA	ARMAMUEBLES, INGENIERIA Y MADERA	2,298,125.15	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
9	010/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V LOS AMANECERES), AUT. SAN ISIDRO. BO. NUEVO AMANECER	IMAS, INGENIERIA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	2,018,322.96	En ejecución	Están trabajando en los contenes
10	011/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V AMOR Y PAZ), SECTOR AGUAS LOCAS	FEPAN CONSTRUCCION, SRL	2,127,495.56	Finalizada	Ya está finalizada, se procederá a realizar la cub. Final
11	012/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR LOS FRAILES II	PROCITROM, SRL	2,450,101.13	Finalizada	
12	013/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA FE), SECTOR NUEVO AMANECER	CONSTRUCTORA KASON, SRL	2,040,901.78	Finalizada	Se están procesando los adicionales
13	014/2017	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V FE Y ESPERANZA), SECTOR VILLA CARMEN	CONSTRUCTORA BISONO ORTIZ Y ASOCIADOS, SRL	3,066,595.42	En ejecución	Va a vaciar la losa de la glorieta
14	016/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V BALBARIN MOJICA), BO. SIMONICO, SECTOR VILLA DUARTE	CENTURY TOWER, SRL	1,784,918.65	Finalizada	Se completó el presupuesto base, se está trabajando los adicionales.
15	017/2017	IMPRIMACION DE CALLES (JV NUEVO HORIZONTE), SECTOR CANCELA	ING. RAYMUNDO DE JESUS ABREU	2,061,431.12	En ejecución	Reinició los trabajos con la ejecución de los badenes (con orden de servicio)
16	018/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V NUEVO ESFUERZO), BO. VIETNAM, SECTOR LOS MINAS	ARQ. JOHANNA ALT. FORTUNA NUÑEZ	2,140,983.86	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
17	019/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (MOV. ACCIÓN PRO. AMBIENTE), BO. RIVIERA DEL OZAMA	PROCITROM, SRL	2,072,655.15	Finalizada	
18	020/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO), BO. JUAN PABLO II. LOS CARTONES	MALDONADO TAPIA Y ASOCIADOS, SRL	1,489,709.21	Finalizada	Pagada



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

25 de octubre de 2017

Actualizado: 25/10/2017

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
19	021/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (ASOCIACIÓN DE MADRES VIETNAM, BO. VIETNAM, SECTOR LOS MINA	RDC SOLUCIONES DE INGENIERIA, SRL	1,159,303.56	Finalizada	Finalizaron los trabajos, se procesara orden de cambio para la cubicación final
20	022/2017	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVIÑON	2,075,131.84	En ejecución	
21	023/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FUNDACIÓN DENIA ARIAS),BO. SIMONICO, SECTOR VILLA DUARTE	ING. RAYMUNDO DE JESUS ABREU	1,906,882.83	En ejecución	Estan trabajando en los contenes y colector, no se ha hecho la cubicación porque no ha llegado al 80% del avance
22	025/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNA LUZ PARA MENDOZA). SECTOR DE MENDOZA	ING. MELANIA CASTRO ARAUJO	2,155,198.53	Licitada	Cheque del avance en tramites
23	026/2017	RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V PAZ Y PROGRESO), MANZANA B, BO. LOS MAMEYES	ING. LUIS HERNANDEZ	2,851,175.10	Licitada	Cheque del avance en tramites
24	027/2017	ASFALTADO DE CALLES (J. V. VIDA Y ESPERANZA), SECTOR LOS FRAILES II	ING. DANILO LARA VILLALONA	2,406,039.44	Licitada	Cheque del avance en tramites
25	028/2017	RECONSTRUCCIÓN ACERAS CONTENES Y PISO EN HORMIGÓN (J.V. VILLA ANACAONA). BO. VILLA ANACAONA	ING. SMERLIN CASTRO	2,443,733.53	Licitada	Cheque del avance en tramites
26	029/2017	BACHEO DE CALLES (ORG. UNIDA SAN ANTONIO), BO. SAN ANTONIO, LOS MINAS	ING. THOMAS MORILLO MEJIA	2,780,815.69	Licitada	Cheque del avance en tramites
27	030/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVO HORIZONTE), SECTOR VILLA LIBERACIÓN	ING. FRANKELIS ANTONIO COLON RUIZ	2,072,842.71	En ejecución	Se está trabajando en la aceras a y contenes
28	031/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TRABAJANDO PARA CRISTO). VILLA LIBERACIÓN	ING. GABRIEL GOMEZ AMANCIO	1,869,111.03	Licitada	Cheque del avance en tramites
29	032/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ASOC. DE MUJERES LUCHANDO POR LA EQUIDAD), BO. LAS FLORES II, SECTOR BRISAS DEL ESTE	ING. JULIO CESAR PEGUERO LOPEZ	2,244,333.23	Licitada	Iniciará el 25/10/2017
30	033/2017	SOLUCIÓN DRENAJE DE PLUVIAL (J. V. LA NUEVA ESPERANZA), BO. SOLARES. EL ALMIRANTE	ING. CARLOS RAFAEL DIAZ MEDINA	2,127,773.90	Licitada	Cheque del avance en tramites
31	034/2017	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. IRIS DEL VALLE), SECTOR LOS MINAS	ING. JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS	1,921,559.45	Licitada	Cheque del avance en tramites
32	035/2017	IMPRIMACIÓN DE CALLES (J. V. AVANZADA ORIENTAL), RES. AVANZADA ORIENTAL, SAN JOSÉ DE MENDOZA	ING. JULITZA GOMEZ TEJEDA	2,167,513.72	Licitada	Cheque del avance en tramites
33	036/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V AMANDA I), SECTOR VILLA FARO	ING. CARLOS M. VASQUEZ	2,105,791.37	Licitada	Cheque del avance en tramites
34	037/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J. V. NUEVO AMANECER), BO. LA GRÚA, SECTOR MENDOZA	ING. REYES MINAYA PARRA	2,124,637.45	Licitada	Cheque del avance en tramites, no se dió el picazo, conflicto entre los delegados por el levantamiento de la obra
35	038/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V CONSEJO PRO-DESARROLLO DE VILLA FARO). SECTOR VILLA FARO	ING. ELIAS WESSIN	2,225,272.08	Licitada	Cheque del avance en tramites



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

25 de octubre de 2017

Actualizado: 25/10/2017

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
36	039/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN MARCOS), SECTOR LOS MINA	ING. NESTOR ENRIQUE LIRANZO PAULINO	2,107,080.93	Licitada	Cheque del avance en tramites
37	040/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. FE Y ACCIÓN), SECTOR LOS MAMEYES	ANA BRITO	2,089,223.44	Licitada	Cheque del avance en tramites
38	041/2017	REPARACIÓN DE PLAY (J.V CLUB DEPORTIVO CULTURAL MENDOZA), SECTOR MENDOZA		2,965,767.29	Licitada	Será ejecutado por el gobierno central
39	042/2017	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (ASOC. COMUNITARIA), BO. LOS COOUITOS. ENS. ISABELITA	ING. BELKIS FLORIAN	1,414,612.14	En ejecución	Picazo 05/09/17, cheque del avance emitido el 11/10/17
40	043/2017	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. HACIENDO CAMINO POR KATANGA). BO. KATANGA. LOS MINAS	ING. PATXY ADONIS PARED DIAZ	1,926,883.78	Licitada	Cheque del avance en tramites
41	044/2017	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V HERVA MENDOZA), RES. HERVA MENDOZA. VILLA FARO	ING. FRAILIN ANDRES VERAS	2,007,373.89	Licitada	Cheque del avance en tramites
42	045/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J. V. NUEVA ESPERANZA), SECTOR LOS FRAILES II	ING. JULISSA E. CASTRO ESTEVEZ	1,841,380.15	Licitada	Cheque del avance en tramites
43		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNIDOS POR LA PAZ DE CAMPANA). SECTOR VILLA FARO	ING. MERCEDES BRITO GERMAN	2,288,966.27	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
44		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V FRENTE DE MUJERES), SECTOR LOS MAMEYES	ING. RAQUEL JOSEFINA GOMEZ SALCEDO	2,816,525.32	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
45		ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR EL DIQUE (J.V EL DIQUE), SECTOR EL DIOUE	GRUPO SALINA OCEANICA, SRL	1,096,411.86	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
46		REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DE CAÑADA (J.V. MUJERES EN ACCIÓN), BO. EL DIOUE I	ING. LUIS MANUEL OVALLES	1,271,074.47	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
47		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V URB. MARGARITA), REPARTO ALMA ROSA	ING. HARLEM R. THOMAS TRONCOSO	3,802,414.34	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
48		REMOZAMIENTO DE CLUB (J.V SOL NACIENTE), SECTOR ALMA ROSA I	ING. JOSE RAMON RAMOS GOMEZ	4,422,822.69	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
49		REPARACIÓN DE PLAY, URB. EL BRISAL, SECTOR MENDOZA	MARTINEZ GARCIA & ASOCIADOS	1,950,479.22	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
50		RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE, C/4TA, RESIDENCIAL ORIENTAL, BO. VILLA FARO	ING. JOSE RAMON RAMOS GOMEZ	2,821,370.69	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
51		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V GREGORIO NATERA), SECTOR VILLA FARO		1,807,793.63	No Licitada	No hubo propuesta, se licitará de nuevo
52		TERMINACIÓN AMPLIACIÓN DE IGLESIA SAN SIMÓN APÓSTOL (ETAPA II). CARRETERA DE MENDOZA. VILLA FARO		1,241,797.68	No Licitada	En proceso de licitación
53		RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (CLUB NUEVA ESPERANZA), BO. MAQUITERIA, SECTOR VILLA DUARTE		1,906,882.83	No Licitada	En proceso de licitación
54		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (MOV. TERESA CONTIGO), BO. LOS COOUITOS. ENS. ISABELITA	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,186,254.92	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
55		CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL, C/1RA, BO. LA LILA, LOS TRES BRAZOS		2,488,741.22	No licitada	En proceso de licitación
56		RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LA NUEVA ESPERANZA), BO. RIVIERA DEL OZAMA	HERCONSI	1,475,348.27	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

25 de octubre de 2017

Actualizado: 25/10/2017

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
57		REPARACIÓN DE MULTIUSOS (J.V BRISA DEL OZAMA), BO. MOISÉS, BRISA DEL OZAMA	ING. ISMAEL ALBERTO HIDALGO FERMIN	1,162,288.81	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
58		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V AMAPOLA II), RES. AMAPOLA		3,677,568.30	No licitada	En proceso de licitación
59		ALUMBRADO DE CALLES (J.V RES. BELINDA), RESIDENCIAL BELINDA	ING. RODOLFO GONZALEZ HICIANO	1,268,408.84	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
60		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. ALTOS DE CANCINO), BO. ALTOS DE CANCINO	ING. ISMAEL ALBERTO HIDALGO FERMIN	2,108,687.25	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
61		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRADO DE LUCERNA), SECTOR LUCERNA	ING. FELIPE E. VIDAL MORENO	2,355,494.36	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
62		REPARACIÓN DE MULTIUSOS (J.V. PRADOS DEL CACHO II), SECTOR LUCERNA	ING. VICTOR MERCADO	1,559,390.29	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
63		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V HERMANOS UNIDOS), SECTOR LOS MINAS SUR		1,891,223.89	No Licitada	No hubo propuesta, se licitará de nuevo
64		RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN), SECTOR LOS MINA	ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA	3,053,795.93	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
65		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV COMUNIDAD LAURA MARIEL). SECTOR LA UREÑA	WICLOK TRADING COMPANY, SRL	2,020,472.74	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
66		CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (ASOC. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS), LOS FRAILES II, J.V. UNION YPAZ III, LOS FRAILES		4,037,731.14	No Licitada	En proceso de licitación
67		J.V. UNION Y PAZ III, LOS FRAILES (UNIFICO EL PP CON (ASOC. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS)			Se repite esta descripción, es solo una información	
68		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (COMITE DE AMAS DE CASA), SECTOR AGUAS LOCAS	ING. VALERIO SEVERINO	2,043,603.62	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
69		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE). SECTOR LOS FRAILES I	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	1,951,955.11	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
70		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIÓN, CONFIANZA Y PROGRESO). BO. CIUDAD DEL ESTE	MALDONADO TAPIA Y ASOCIADOS, SRL	2,273,670.10	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
71		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. LA MONEDA), RES. LA MONEDA I		3,090,746.52	No licitada	En proceso de licitación
72		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. LOS MAESTROS), CALLE PROFESOR FELIZ GARCÍA. SECTOR LOS MAESTROS III		2,283,942.63	No licitada	En proceso de licitación
73		ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V LOS OLVIDADOS DE MENDOZA), SECTOR DE MENDOZA	ING. RAQUEL JOSEFINA GOMEZ SALCEDO	3,666,154.15	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
74		ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V LOS COCOS), BO. LOS COCOS, SECTOR MENDOZA	GRUPO SALINA OCEANICA, SRL	3,683,679.73	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
75		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V PAZ Y AMOR), BO. LOS LAURELES II. SECTOR BRISAS DEL ESTE	ING. MERCEDES BRITO GERMAN	2,192,713.07	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
76		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J. V. FE Y CARIDAD), BO. LA ALTAGRACIA. BRISA DEL ESTE	WICLOK TRADING COMPANY, SRL	1,676,583.21	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
77		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUNTA DE DESARROLLO COMUNITARIO). SECTOR BRISAS DEL ESTE II	ING. HARLEM R. THOMAS TRONCOSO	1,949,432.59	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017


25 de octubre de 2017

Actualizado: 25/10/2017

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
------	-----------	-------------	-------------	------------------	--------	-------------


1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:

1.- ESTADO DE SITUACION GENERAL DE LAS OBRAS

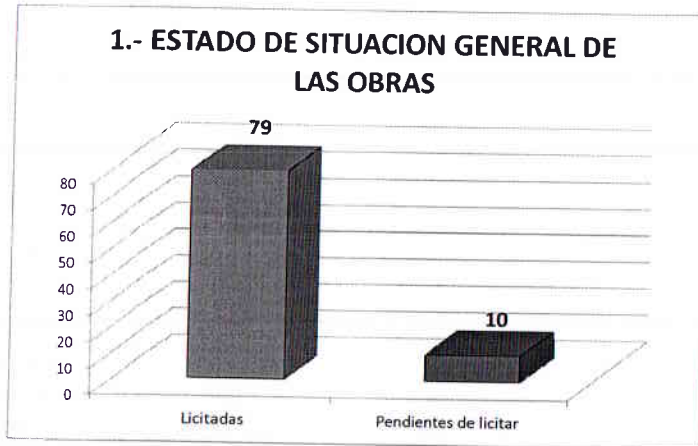

1.- ESTADO DE SITUACION GENERAL DE LAS OBRAS		
Estado	Cantidad	Porcentaje %
Licitadas	79	88.76%
Pendientes de licitar	10	11.24%
TOTAL	89	100.00%

1.1 SITUACION DE LAS OBRAS LICITADAS

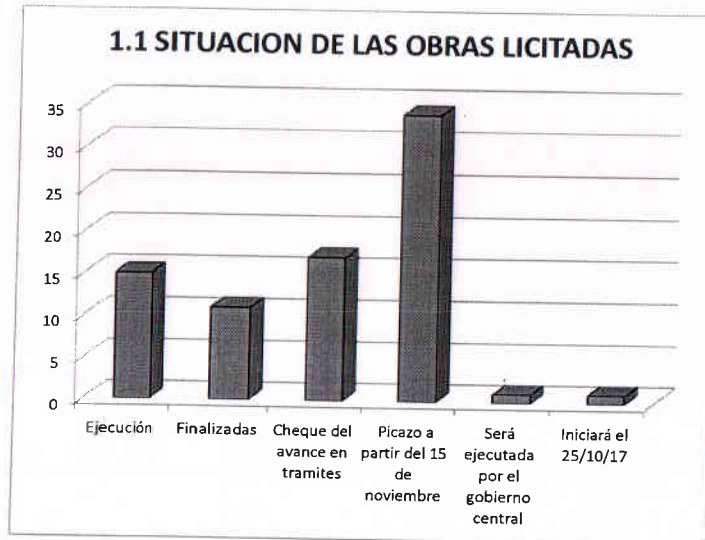

1.1 SITUACION DE LAS OBRAS LICITADAS		
Estado	Cantidad	Porcentaje %
Ejecución	15	18.99%
Finalizadas	11	13.92%
Cheque del avance en tramites	17	21.52%
Picazo a partir del 15 de noviembre	34	43.04%
Será ejecutada por el gobierno central	1	1.27%
Iniciará el 25/10/17	1	1.27%
TOTAL	79	100.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

25 de octubre de 2017

Actualizado: 25/10/2017

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
------	-----------	-------------	-------------	------------------	--------	-------------



1.3 SITUACION DE LAS OBRAS NO LICITADAS		
Estado	Cantidad	Porcentaje %
En proceso de licitación	7	70.00%
No hubo propuesta, se licitará de nuevo	2	20.00%
No hay solar disponible	1	10.00%
TOTAL	10	100.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

25 de octubre de 2017

Actualizado: 25/10/2017

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
78		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ASOCIACIÓN DE JÓVENES 24 DE ABRIL). SECTOR BRISAS DEL ESTE	ING. RAQUEL ANTONIA CUELLO	1,880,420.90	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
79		ASFALTADO DE CALLES (J.V. JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAÑA, SECTOR ALMIRANTE	ING. JOSE FCO. GUABA MERCADO	2,002,200.92	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
80		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMÓN MATÍAS MELLA). BARRIO EL KENEDY II	ING. MARIA EUGENIA CABRERA MENA	1,944,520.00	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
81		CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V GRAN PODER DE DIOS), LA CAÑA. EL ALMIRANTE		3,874,439.00	No licitada	No existe un solar disponible para tal ejecución
82		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), BO. PROYECTO RESTAURACIÓN. EL ALMIRANTE	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,221,135.35	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
83		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V INVIMOSA II), BO. INVIMOSA	DENISERVIC, SRL	2,061,353.78	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
84		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA CARMEN ESTE), SECTOR VILLA CARMEN	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,225,176.00	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
85		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BLOQUE DE ORGANIZACIÓN POPULAR). SECTOR CANCINO ADENTRO	GRUPO GARCOM, SRL	2,066,847.79	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
86		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FRENTE DE MUJERES UNIDAS). BO. MARGARA I. EL TAMARINDO	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS EMA, SRL	1,738,109.37	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
87		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J. V. UNIÓN Y PROGRESO), CANCINO ADENTRO	ING. JOSE ANTONIO VILLANUEVA AGUERO	1,687,607.69	Licitada	Picazo a partir del 15 de noviembre
88		EQUIPAMIENTO, (IGLESIA EPIFANIA DEL SEÑOR), VILLA CARMEN		1,913,775.00	En ejecución	Equipamiento, no es una obra. Pertenece a Desarrollo Comunitario
89		EQUIPAMIENTO, (J.V SIMÓN OROZCO), INVIVIENDA		1,913,775.00	En ejecución	Equipamiento, no es una obra. Pertenece a Desarrollo Comunitario
90		EQUIPAMIENTO, (PATRONATO RES. DEL ESTE), RES. DEL ESTE		1,913,775.00	En ejecución	Equipamiento, no es una obra. Pertenece a Desarrollo Comunitario
				196,538,161.48		

Preparado por la División de Cubicaciones

Nota: en el número de orden 67, aparece una descripción que por error se estaba contabilizando como una obra, eso es solo una información, no una obra, por tal razón la sumatoria total es 89 obras.-



25/10/2017

FECHA

