# Informe de Reuniones del Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal 2025

En el marco de los trabajos de supervisión y acompañamiento a la ejecución de las obras correspondientes al Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2025, se llevaron a cabo dos reuniones con el Comité de Seguimiento los días 9 y 12 de septiembre del presente año.

Durante estos encuentros se abordaron de manera amplia las siguientes temáticas:

**Situación actual de las obras**
Se expusieron los avances de las diferentes iniciativas incluidas en el PPM 2025, destacando los niveles de cumplimiento de los cronogramas establecidos y los principales retos enfrentados durante el proceso.
Se identificaron las obras que han alcanzado un desarrollo satisfactorio y aquellas que requieren mayores esfuerzos de coordinación y supervisión.

**Obras ejecutadas al 100%**

El Comité reconoció las obras ya concluidas en su totalidad, resaltando la importancia de la rendición de cuentas a la comunidad beneficiaria.
Se subrayó la necesidad de socializar estos logros para fortalecer la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de participación.

**Obras pendientes por ejecutar**

Se detallaron las obras que aún no han sido iniciadas o que presentan un porcentaje de avance por debajo de lo esperado.
Se discutieron las posibles medidas correctivas y de acompañamiento necesarias para garantizar el cumplimiento del plan establecido.
En ambas reuniones se reafirmó el compromiso del Comité de Seguimiento con la transparencia, la supervisión constante y la búsqueda de soluciones conjuntas que permitan materializar los proyectos priorizados por la ciudadanía en el marco del Presupuesto Participativo Municipal 2025.

**Conclusión**
El Comité valoró la importancia de continuar con el seguimiento cercano a cada obra, asegurando que las mismas sean ejecutadas en los plazos y con la calidad requerida, en beneficio de las comunidades participantes.

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE SECRETARIA TECNICA

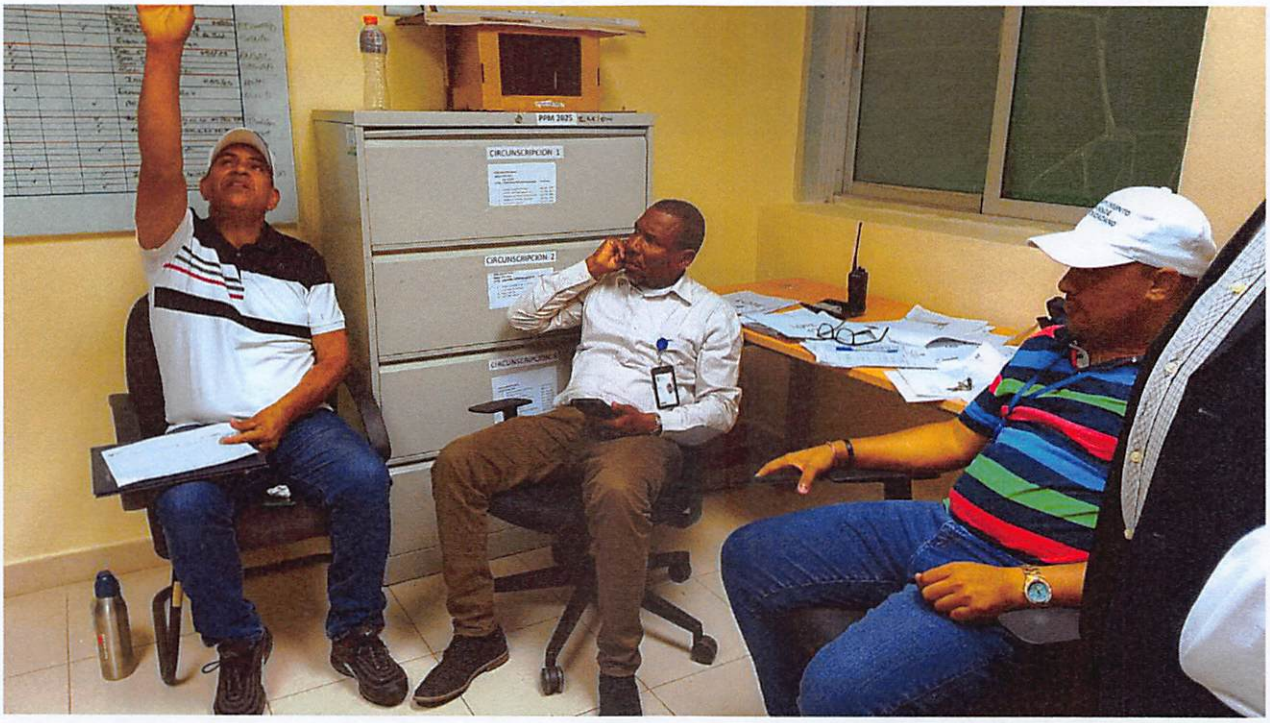
CIRCUNSCRIPCION 1
CIRCUNSCRIPCION 2

ALCALDÍA Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO ESTE COSTA DEL FARO

**Fecha:** 9 sept. 2025.-

**Tema: Mesa: Comité de Seguimiento**

| No. | NOMBRE | ORGANIZACIÓN | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| 1 | Brígida A. Valeroz Avila | Pdta. Junta de Vecinos Urb. Martin | 809 886 1670 |
| 2 | Germonia A. Feliz | " IDV. La comunidad | 809 662-2498 |
| 3 | Esus Yulcedo Patiño | Pst. JVC. Maria [illegible] | 829-705-0479 |
| 4 | José Miguel Valdez | Junta de Vecinos Esperanzas | 8097772121 |
| 5 | [signature] | | |
| 6 | Ana Luis Reynoso | Fiscalizadora de Obras | 829-440-2115 |
| 7 | Yldo P. Castro √ | Supervisión | 809-968-6821 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | Ezequiel [illegible] Calzado | | 849-455-0847 |

ALCALDÍA SANTO DOMINGO ESTE · GESTIÓN 2024-2028 · SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

ALCALDÍA Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO ESTE COSTA DEL FARO

**Fecha:** 12 de septiembre 2025

**Tema: Mesa: Comité de Seguimiento**

| No. | NOMBRE | ORGANIZACIÓN | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] Patiño | J.V. Residencial [illegible] | 829-705-0479 |
| 2 | Rojas Crozcana | J.V. Urb. Rey. Mendoza I | 809-887-3993 |
| 3 | Mari M. Batista Guerrero | J.V. unidos somos más | 849-628-3252 |
| 4 | Allender Santana | J.V. Cabirma del Este | 829-764-9244 |
| 5 | Manuel Carraza | J.V. Cerromba II (Bloque 9) | 809-764-0978 |
| 6 | Virnel Susana Ovalle | Junta de V. monumental | 809 974 2662 |
| 7 | Erick Sanchez | Junta de vecinos Barbacoa | 829 903 1120 |
| 8 | Santo mantera | J.V. Dionisio Nací Martinez | 809 7983205 |
| 9 | Teresa Soler | J.V. Sol Naciente | 809 5947535 - 809 5011514 |
| 10 | Elly Gonzalez M | Junta de vecinos Fragonton | 809 2581382 |
| 11 | Rubén Fabián J. | J.V. Esperanza | 829-215-2302 |
| 12 | Adoni Beriguete Aquino | J.V. Nuevo Horizonte | 809-428-1115 |
| 13 | BERTHA maria Santana | J.V. los del mundo | 829-7233114 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | Ezequiel Peguero Calzado | | |

ALCALDÍA SANTO DOMINGO ESTE · GESTIÓN 2024-2028 · SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

ALCALDÍA Santo Domingo Este

# AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE

## OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025

SANTO DOMINGO ESTE COSTA DEL FARO

| OBRAS PROGRAMADAS | UBICACIÓN | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | | | SITUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESUPUESTO ESTIMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | TERMINADA 95 a 100% | MAS 80% | MAS DE 50% MENOS 80% | MENOS 50% | SIN INICIAR | % EJECUTADO | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (LOS PIONEROS) | ALMA ROSA I | 2,128,516.82 | 1,915,665.14 | | ✓ | | | | 0.90 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (NUEVO AMANECER DE ALMA ROSA) | ALMA ROSA I | 2,473,266.36 | 2,225,939.72 | | ✓ | | | | 0.90 | |
| ACERAS Y CONTENES (SOL NACIENTE) | ALMA ROSA I | 2,001,572.49 | 24,999.64 | | | | | ✓ | 0.012 | A punto de iniciar |
| REMOZAMIENTO DE PARQUE (ALTO DEL DIQUE) | ENSANCHE OZAMA | SELECCION DE OBRA Y LEVANTAMIENTO | | | | | | | | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V JUAN PABLO DUARTE) | URBANIZACIÓN JUAN PABLO DUARTE | 2,475,142.77 | 1,237,571.39 | | | | ✓ | | 0.50 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MENDOZA I) | MENDOZA I | 2,370,321.07 | 1,540,708.70 | | | | ✓ | | 0.65 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V VECINOS UNIDOS) | LAS PALMAS DE ALMA ROSA | 2,500,992.37 | 2,000,793.90 | | | | ✓ | | 0.80 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. ISABEL II) | VILLA FARO | 2,488,812.26 | 1,617,727.97 | | | ✓ | | | 0.65 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (URB. MARLIN) | VILLA FARO | 1,692,056.62 | 1,607,453.79 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (ESPERANZA SUR) | ESPERANZA SUR | 2,202,698.49 | 1,541,888.94 | | | ✓ | | | 0.70 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (LA COMUNIDAD DE ALMA ROSA II) | ALMA ROSA II | 2,793,360.69 | 2,514,024.62 | | ✓ | | | | 0.90 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (RESD. MARIA MERCEDES) | VILLA FARO | 2,103,217.86 | 1,998,056.97 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| PROYECTO DE CAÑADA (BARBARIN MOJICA) | VILLA DUARTE | 1,890,967.47 | 25,002.37 | | | | | ✓ | 0.01 | A punto de iniciar |
| PROYECTO DE CAÑADA (LA CAÑADA DE VILLA DUARTE) | VILLA DUARTE | 1,290,651.94 | 1,032,521.55 | | ✓ | | | | 0.80 | |
| PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CENTRO MAQUITERIA) | MAQUITERIA | 2,499,454.21 | 2,499,454.21 | ✓ | | | | | 100.00 | |
| ARREGLO DE CALLES (AMADO GOMEZ) | LOS MOLINOS DOMINICANOS, VILLA DUARTE | 1,805,269.38 | 1,949,690.93 | ✓ | | | | | 100.00 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. SANTA ISABEL) | ENSANCHE ISABELITA | 1,384,338.25 | 1,384,338.25 | ✓ | | | | | 100.00 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LOS FARALLONES) | ENSANCHE ISABELITA | 2,556,848.78 | 1,917,636.59 | | | ✓ | | | 0.75 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PROFESOR SOCRATES) | LOS MAMEYES | 1,978,333.46 | 494,583.37 | | | | ✓ | | 0.25 | |
| ARREGLO DE CALLES (J.V. RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCI) | LOS MAMEYES | 2,274,362.51 | 24,999.79 | | | | | ✓ | 0.01 | A punto de iniciar |
| CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO PROGRESANDO POR UN DESARROLLO COMUNITARIO) | RIVERA DEL OZAMA | 1,192,143.86 | 1,192,143.86 | ✓ | | | | | 100.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPARACION DE CENTRO COMUNAL (DE FRENTE AL FUTURO) | SANTO TOMAS DE AQUINO | 1,906,053.03 | 25,007.42 | | | | | ✓ | 0.01 | Asamblea comunitaria |
| REPARACION DE CENTRO COMUNAL (NUEVO AMANECER) | SANTO TOMAS DE AQUINO | 1,120,201.82 | 25,002.90 | | | | | ✓ | 0.02 | A punto de iniciar |
| SEÑALIZACION VIAL Y ROTULACION (ALTOS DE CHAVON) | LOS TRES BRAZOS | 2,741,915.99 | 2,193,532.79 | | ✓ | | | | 0.80 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (NUEVO RENACIMIENTO) | VIETNAM, LOS MINA | 1,320,617.64 | 1,122,524.99 | | ✓ | | | | 0.85 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (MANUELA DIEZ) | KATANGA | 2,643,474.95 | 2,511,301.20 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| ARREGLOS DE CALLES (CARLOS TEO CRUZ) | LOS MINA | 2,400,709.65 | 25,000.99 | | | | | ✓ | 0.01 | A punto de iniciar |
| ARREGLOS DE CALLES (CONSEJO COMUNITARIO) | JUAN PABLO II | 669,883.57 | 25,000.05 | | | | | ✓ | 0.04 | A punto de iniciar |
| REPARACIÓN DE CLUB (URB. LUCERNA P-2) | LUCERNA | 4,478,399.84 | 24,998.43 | | | | | ✓ | 0.01 | A punto de iniciar |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNIVERSO 1ERO) | LUCERNA | 2,254,373.56 | 1,803,498.85 | | ✓ | | | | 0.80 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (CABILMA DEL ESTE) | LUCERNA | 2,448,324.34 | 1,836,243.26 | | | ✓ | | | 0.75 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (PRADO DEL CACHON) | PRADO DEL CACHON | 674,069.62 | 674,069.62 | ✓ | | | | | 100.00 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (LA SAGRADA FAMILIA) | ENSANCHE FELICIDAD, LOS MINA NUEVO | 2,056,637.83 | 822,655.13 | | | | ✓ | | 0.40 | Orden de cambio |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (JUAN PABLO DUARTE) | LOS MINA SUR | 1,176,640.26 | 25,062.44 | | | | | ✓ | 0.02 | A punto de iniciar |
| REPARACION DE CLUB E INSTITUCION DEPORTIVA (ISLA EN COSECHA) | LAS ENFERMERAS | SELECCION DE OBRA Y LEVANTAMIENTO | | | | | | | | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (DON IGNACIO MARTINEZ) | LOS MINA | 759,734.24 | 24,995.26 | | | | | ✓ | 0.03 | A punto de iniciar |
| ARREGLO DE CALLE (UNIENDO LA FAMILIA) | BRISAS DE LAS AMERICAS, LA UREÑA | 2,609,032.98 | 1,043,613.19 | | | | ✓ | | 0.40 | |
| ACERAS Y CONTENES (OCB CLUB DEPORTIVO) | NUEVO AMANECER, LA UREÑA | 2,494,679.38 | 2,369,945.41 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| ACERAS Y CONTENES (LA LUZ DEL MUNDO I) | NUEVO AMANECER | 2,500,651.41 | 2,375,618.84 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (NUEVA ESPERANZA) | NUEVO AMANECER | 2,572,119.44 | 1,028,847.78 | | | | ✓ | | 0.40 | |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (HERMANAS MIRABAL II) | SAN BARTOLO | 2,192,437.01 | 876,974.80 | | | | ✓ | | 0.40 | |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVO HORIZONTE) | NUEVO HORIZONTE | 1,003,321.12 | 601,992.67 | | | ✓ | | | 0.60 | |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LUZ MARIA II) | LUZ MARIA | 2,498,252.93 | 2,373,340.28 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LUZ MARIA IV) | LUZ MARIA | 2,500,039.71 | 2,500,039.71 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (SAN BERNARDO) | LOS FRAILES I | 1,561,936.70 | 624,774.68 | | | | ✓ | | 0.40 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (RAMON HENRIQUE DURAN) | LOS FRAILES I | 2,417,371.24 | 2,175,634.12 | | ✔ | | | | 0.90 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNIDAD Y PROGRESO FRAILES I) | LOS FRAILES I | 2,380,835.45 | 2,142,751.91 | | ✔ | | | | 0.90 | |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FRAY ANTON DE MONTESINO) | LOS FRAILES | 2,165,415.93 | 1,732,332.74 | | | ✔ | | | 0.80 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (CIUDAD KOLOSAL) | CIUDAD KOLASAL | 2,061,310.08 | 1,855,179.07 | | ✔ | | | | 0.90 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (PRADO ORIENTAL IB) | PRADO ORIENTAL | 2,972,848.35 | 445,927.25 | | | | ✔ | | 0.15 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (BRISA ORIENTAL 8) | BRISA ORIENTAL VIII | 1,619,578.51 | 25,006.29 | | | | | ✔ | 0.02 | A punto de iniciar |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (VECINOS UNIDOS PARAISO ORIENTAL) | PARAISO ORIENTAL | 2,711,895.96 | 25,057.92 | | | | | ✔ | 0.01 | Proceso de desbroce y demolicion y evaluación |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (BUENA VENTURA DE MENDOZA) | MENDOZA | 2,034,667.52 | 1,932,934.14 | ✔ | | | | | 0.95 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (HERMANAS MIRABAL) | MENDOZA | 1,942,222.91 | 1,845,111.76 | ✔ | | | | | 0.95 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (UNA LUZ PARA MENDOZA) | MENDOZA | 1,950,794 | 1,853,254.42 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (BRISA DE LA CHARLES) | MENDOZA | 2,170,997.11 | 2,062,447.25 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZAL) | BRISA DEL ESTE | 2,453,433.48 | 981,373.39 | | | | ✓ | | 0.40 | |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS SOMOS MAS) | BRISA DEL ESTE | 3,352,730.95 | 3,017,457.86 | | ✓ | | | | 0.90 | |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. QUINTO CENTENARIO) | BRISA DEL ESTE | 2,560,896.54 | 24,999.47 | | | | | ✓ | 0.01 | A punto de iniciar |
| CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. AMOR Y PAZ) | BRISA DEL ESTE | 2,483,958.73 | 24,998.56 | | | | | ✓ | 0.01 | A punto de iniciar |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA TORONJA) | LA TORONJA | 2,948,945.10 | 25,007.05 | | | | | ✓ | 0.01 | A punto de iniciar |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA DEL EDEN) | BRISA DEL EDEN | 2,355,927.88 | 24,996.39 | | | | | ✓ | 0.01 | A punto de iniciar |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDOS POR LA COMUNIDAD) | VILLA ESFUERZO | 2,667,342.97 | 25,006.34 | | | | | ✓ | 0.01 | A punto de iniciar |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNION) | VILLA ESFUERZO | 2,199,238.01 | 1,979,314.21 | | ✓ | | | | 0.90 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (INVI-VENECIA) | INVIVIENDA | 2,394,077.75 | 2,274,373.86 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| ARREGLO DE CALLE (UNION DE VECINOS FE Y ESPERANZA) | RESPALDO VILLA CARMEN | 2,574,913.77 | 25,002.41 | | | | | ✓ | 0.01 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FUNDACION PADRE CLEMENTE) | VILLA CARMEN | 1,992,922.19 | 1,893,276.08 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FE Y ESPERANZA) | RESPALDO VILLA CARMEN | 2,211,854.62 | 1,990,669.16 | | ✓ | | | | 0.90 | |
| ACERAS Y CONTENES (RES. CORAMBAR) | CORAMBAR | 2,447,147.37 | 2,324,790.00 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNION Y PROGRESO) | EL PERLA | 1,856,185.41 | 24,999.11 | | | | | ✓ | 0.01 | |
| ARREGLO DE CALLE (COLINA DEL ORIENTE I) | VILLA LIBERACIÓN | 2,618,472.64 | 2,487,549.01 | ✓ | | | | | 0.95 | |
| SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (JERUSALEN VILLA TROPICALIA) | VILLA TROPICALIA | 2,698,028.16 | 24,983.74 | | | | | ✓ | 0.01 | |
| | | | 86,923,675.92 | | | | | | | |

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025

| ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS | CANTIDAD | PORCENTAJE % |
|---|---|---|
| OBRAS EJECUTADAS | 30 | 42.86 |
| OBRAS EN PROCESO | 20 | 28.57 |
| OBRAS PENDIENTES | 20 | 28.57 |
| **TOTAL** | **70** | **100** |

### 2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DEL AÑO 2025

| FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA | MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO | DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 183,591,593.74 | 86,923,675.92 | 96,667,917.82 | 47.35% |

EZEQUIEL PEGUERO CALZADO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
30 DE SEPTIEMBRE 2025

ALCALDÍA SANTO DOMINGO ESTE
GESTIÓN 2024-2028
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
